

STRATEGIASUUNNITELMA
Rosiori de Vede-
massasterilointi- ja avustusprojekti

Laatijat: Anna-Sisko Sorsa ja Maarit Auranen

Päiväys: 5.10.2015

Luottamuksellisuus: julkinen

Hallitus hyväksynyt pvm: 5.10.2015

SISÄLTÖ

| | |
|---|---|
| 1. <u>PROJEKTIN TAUSTA</u> | 3 |
| 2. <u>KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNSAAJAT</u> | 4 |
| 3. <u>PROJEKTIN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT</u> | 4 |
| 3.1 <u>Projektin sisällölliset tavoitteet</u> | 4 |
| 3.2 <u>Projektin muut tavoitteet</u> | 4 |
| 4. <u>PROJEKTIN TARVESELVITYS (RESURSSIT)</u> | 5 |
| 5. <u>PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO</u> | 5 |
| 6. <u>PROJEKTIN ORGANISAATIO</u> | 6 |
| 6.1 <u>Projektin ohjausryhmä</u> | 6 |
| 6.2 <u>Projektin asiantuntijajäsenet</u> | 7 |
| 6.3 <u>Projektiryhmä</u> | 7 |
| 7. <u>PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO</u> | 7 |
| 8. <u>PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN</u> | 8 |
| 9. <u>PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA</u> | 9 |
| 9.1 <u>Riskit</u> | 7 |
| 9.2 <u>Riskiä hallinta</u> | 8 |
| 10. <u>PROJEKTIN LAADUN VARMISTAMINEN</u> | 8 |
| 10.1 <u>Projektin raportointi</u> | 8 |
| 10.2 <u>Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset</u> | 8 |
| 10.3 <u>Projektin dokumentoinnin hallinta</u> | 8 |
| 11. <u>TOIMINNAN ARVIOINTI</u> | 9 |

1 PROJEKTIN TAUSTA

Romaniassa elää varovaistenkin arvioiden mukaan kaksi miljoona kulkukoira. Käsite on hämäävä, sillä valtaosa näistä koirista on entisiä lemmikkejä ja niiden jälkeläisiä. Romaniassa on 80-luvulta lähtien säännöllisin väliajoin yritetty päästä eroon katukoiraaongelmasta ns. joukkolahtaamisilla. Tämä ei kuitenkaan hävitä koirakantaa, päinvastoin. Silmittömien julmuuksien lisäksi hävitysmetodi vain vahvistaa jäljelle jäänyttä kantaa entisestään. Ainoa toimiva ratkaisu on katukoirien sterilointi, myös Maailman terveysjärjestö WHO:n [suosituksen](#) mukaan.

Rescueyhdistys Kulkurit ry haluaa vaikuttaa eettisesti kestäväällä tavalla eläinsuojelun saralla, olla tekemässä muutosta siellä missä sitä eniten tarvitaan ja pureutua ongelman alkulähteille. Tätä varten Rescueyhdistys Kulkurit ry on lanseerannut #spayone- kampanjan, jonka alla toteutetaan kaikki Kulkurien sterilointikampanajat.

Rosiori de Veden massasterilointi- ja avustusprojekti on osa kampanjaa, mutta eroaa sen muista sterilointiprojekteista säännöllisen toistuvuutensa vuoksi.

3 000 asukkaan Rosiori de Vede sijaitsee 120 km Bukarestista lounaaseen. Kaupungin kunnallisella tarhalla on säännöllisesti 250-350 koiraa ja uusia koiria tulee noin 20 viikossa. Paikallinen eläinsuojelija Cornelia Stanescu on saanut neuvoteltua varsin poikkeuksellisen sopimuksen kunnan kanssa tarhan koirien hoitamisesta ja ruokkimisesta omalla kustannuksellaan. Tarhalla syntyy kuitenkin jatkuvasti pentuja, joilla on näissä olosuhteissa huonot selviytymismahdollisuudet. Koirien lukumäärä tarhalla kasvaa koko ajan käynnissä olevista adoptio-ohjelmista huolimatta. Adoptiot eivät yksinään olekaan ratkaisu merkittävään kulkukoiraongelmaan, joskin ne luonnollisesti vaikuttavat merkittävästi jokaisen adoptoidun eläimen elämään. Adoptiotoimintaa Cornelia pyörittää pienen saksilaisvetoisen yhdistyksensä HULDAN kanssa. Myös Kulkureilla on pienimuotoista adoptiotoimintaa Rosiorin koirien suhteen yhteistyössä Cornelian kanssa.

Rescueyhdistys Kulkurit ry:n yhteistyössä romanialaisen eläinsuojelujärjestön RAR:n (Romania Animal Rescue) kanssa aloittama massasterilointi- ja avustusprojekti on pitkän tähtäimen kestävä eläinsuojelutyötä ja sen tarkoitus on vaikuttaa paitsi yksittäisten koirien elämään välittömästi, myös pysyvästi tulevaisuuden katukoiratilanteeseen. Tavoitteena on Rosiori de Veden ja sen ympäristön katukoirapopulaation lasku 95%:lla.

Projekti on ensimmäinen laatuaan ja onnistuessaan tulee toimimaan konkreettisenä esimerkkinä projektista, jonka voi monistaa mihin tahansa kaupunkiin. Projektissa steriloitavat eläimet saavat lisäksi rabiesrokotteen, ne mikrosirutetaan ja kirjataan kansalliseen tietokantaan. Nämä toimenpiteet laskevat eläimen hylkäämisen todennäköisyyttä selvästi. Tästä ei koidu eläinten omistajille lainkaan kuluja. Lisäksi projektin tavoitteena on valistaa paikallista väestöä sterilointien tarpeellisuudesta sekä vastuullisesta eläimenpidosta ja rohkaista heitä viemään sanaa eteenpäin. Tulevaisuudessa tullaan painottamaan erityisesti lasten ja nuorten opettamista ja valistamista esimerkiksi kouluvierailuin ja erilaisin tietoiskuin. Steriloinnit ja paikallisten valistus kulkevat käsi kädessä.

Projekti toimii täysin lahjoitusvaroin ja vapaaehtoistyövoimalla. Kulut muodostuvat kuukausittaisten ilmaissterilointipäivien operaatioista, käytännön järjestelyistä, tarvittavien lääkkeiden ja rokotteiden sekä

muiden toimenpiteessä välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta. Tilat (sisältäen sähköt ja vedet) sterilointipäivälle Rosiori de Veden kunta tarjoaa poikkeuksellisesti ilmaiseksi projektin käyttöön.

2 PROJEKTIN KOHDERYHMÄ JA HYÖDYNAAJAT

Projektin välitön kohderyhmä ovat romanialaiset koirat, sekä omistetut, että kodittomat koirat.. Valistustoiminnan kohderyhmää ovat paikalliset koirien omistajat, erityisesti lapset ja nuoret sekä kaikki eläinten kanssa jollakin tavoin tekemisissä olevat tahot. Hyödynsääjiin kuuluvat yhteistyötarjojen koirat ja välillisesti myös romanialainen koirapopulaatio laajemmassa mittakaavassa. Projektista hyötyvät myös paikalliset eläinsuojelijat sekä sterilointipäiviin osallistuvat paikalliset ihmiset.

3 PROJEKTIN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT

3.1 Projektin sisällölliset tavoitteet

- Vähentää Rosiorin ja sen ympäristön koiramäärää pysyvästi (95 %)
 - Tavoitteena noin viiden vuoden aikajänteellä saada pudotettua koirapopulaation kokoa noin 50-100 yksilöön
- Saattaa kaupungin kunnallisen tarhan olot länsimaisten standardien ja lainsäädännön mukaiselle tasolle
- Saada tarha tautivapaaksi; keinoina rokotukset, yleinen siisteys ja hygienenisyys
- Saada kaupungin eläinlääkäri paikalle säännöllisesti ja aina tarvittaessa hoitamaan koiria
- Vaikuttaminen romanialaisten yhteistyötahojen asenteisiin eutanasiaa kohtaan.
 - Keskittyminen erityisesti lasten ja nuorten valistamiseen ja sitouttamiseen kestävään eläinsuojelutyöhön
- EU- parlamentin kannanotto:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-291>

3.2 Projektin muut tavoitteet

Rosiori de Vede-massasterilointi- ja avustusprojektin tavoite on tulla toimimaan pilottina muissa romanialaisissa kaupungeissa toteutettaville vastaaville projekteille.

Lisäksi tämä projektisuunnitelma toimii pohjana ja pilottina Rescueyhdistys Kulkurit ry:n vastaaville projekteille.


4 PROJEKTIN TARVESELVITYS (RESURSSIT)

- Henkilöstöresurssit Suomessa
- Henkilöstöresurssit Romaniassa
- Taloudelliset resurssit
- Laite- ja tarvikeresurssit
- Ajalliset resurssit
- Tilaresurssit

5 PROJEKTIN KUSTANNUSARVIO

[Yksikköhinnat ja kustannusseuranta](#)

6 PROJEKTIN ORGANISAATIO

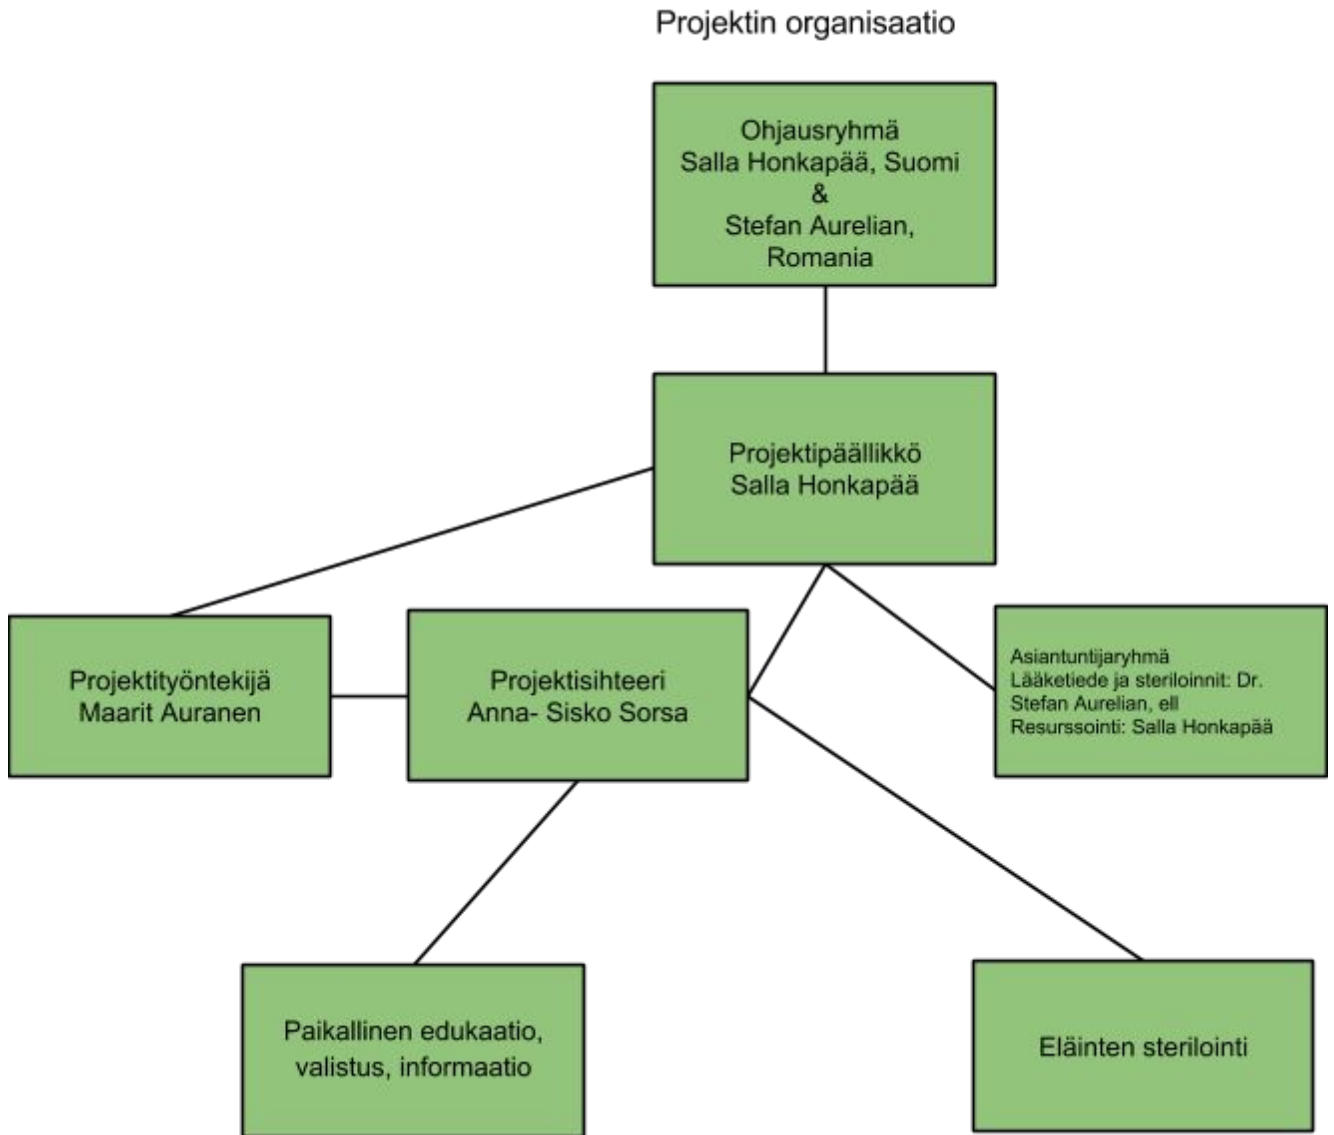

Kuvio 1. Projektin organisaatio

6.1 Projektin ohjausryhmä

Projektin ohjausryhmään kuuluu Rescueyhdistys Kulkurit ry:n puheenjohtaja Salla Honkapää Suomesta sekä eläinlääkäri Dr. Stefan Aurelian Romaniasta.

6.2 Projektin asiantuntijajäsenet

Dr. Stefan Aurelian toimii lääketieteen konsulttina sterilointeja, turvasirutuksia sekä rabiesrokotuksia koskien.

6.3 Projektiryhmä

Dr. Stefan Aurelian ja Salla Honkapää (ohjausryhmä)

Salla Honkapää (projektipäällikkö)

Anna-Sisko Sorsa (projektisihteeri)

Maarit Auranen (projektityöntekijä)

Veera Nuri (verkostotyö Romaniassa)

7 PROJEKTIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO

Projekti on julkinen. Projektisuunnitelma on luettavissa Rescueyhdistys Kulkurit ry:n verkkosivuilla osoitteessa:

8 PROJEKTIN TIEDOTTAMINEN

Projektista tiedotetaan Rescueyhdistys Kulkurit ry:n verkkosivuilla, projektin Facebook-sivulla sekä yhdistyksen Twitter- ja Instagram -tilillä.

9 PROJEKTITOIMINNAN RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

9.1 Riskit

- Taloudelliset resurssit: projekti toimii täysin lahoitusvaroin, eikä yksittäisessä sterilointipäivässä steriloitavien eläinten määrää pysty ennakoimaan.
- Paikallisten yhteistyötahojen ja viranomaisten välinen yhteistyö: haasteet kommunikoinnissa ja siinä esiintyvät kulttuurien väliset erot, sekä paikallisen järjestelmän ajoittainen arvaamattomuus.
- Kommunikaatiohaasteet: tiedonkulku Kulkurit ry:n edustajien sekä romanialaisten toimijoiden välillä
- Ajalliset resurssit: Projekti toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Tällä hetkellä projektissa ei ole palkattua työvoimaa Suomessa eikä Romaniassa.

9.2 Riskien hallinta

- Taloudelliset resurssit: Aktiivinen kampanjointi ja varainkeruutempaukset. Sosiaalisella medialla merkittävä asema lahjoittajien rekrytoinnissa ja projektin näkyväksi tekemisellä.
- Paikallisten yhteistyötahojen ja viranomaisten välinen yhteistyö: säännöllinen yhteydenpito yhteistyötahoihin, asiallisen keskusteluyhteyden ylläpitäminen
- Kommunikaatiohaasteet: tehtävänjako sujuvan tiedonkulun ylläpitämiseksi (projektisihteeri hoitaa käytännön yhteydenpidon romanialaisten yhteistyötahojen kanssa projektin käytännön järjestelyjen suhteen), selkeiden yhteydenpitokanavien ylläpitäminen, ja säännöllinen yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kesken.
- Ajalliset resurssit: Selkeä työnjako projektiryhmän jäsenten kesken, jäsenten yksilöllisten resurssien huomioiminen ja oikeanlainen hyödyntäminen, sekä selkeä, säännöllinen ja jatkuva kommunikointi ryhmän jäsenten kesken. Tarvittaessa tehtävien uudelleenjärjestely. Projektisuunnitelman säännöllinen päivittäminen ja ylläpito (projektisihteeri)

10 PROJEKTIN LAADUN VARMISTAMINEN

10.1 Projektin raportointi

Säännöllinen tiedottaminen Rescueyhdistys Kulkurit ry:n aktiivien suljetuilla tiedotuskanavilla, sekä yhdityksen julkisilla verkkosivuilla sekä aiemmin mainituilla sosiaalisen median kanavilla.

10.2 Projektin ohjaus- ja asiantuntijaryhmän kokoukset

Yhteydenpito pääasiassa sähköisesti maantieteellisestä etäisyydestä johtuen. Virtuaalokokousten käytännön toteutusta selvitetään. Pöytäkirjan pitäminen ja projektisuunnitelman päivittäminen pöytäkirjan pohjalta.

10.3 Projektin dokumentoinnin hallinta

- Projektisuunnitelman ylläpito (projektisihteeri) (Google Drive)
- Kokouspöytäkirja
- Kuluseuranta (projektisihteeri) (Google Drive)

11 TOIMINNAN ARVIOINTI

Projektiryhmä arvioi jatkuvasti toimintansa tehokkuutta. Lisäksi yhdistyksen aktiivijäsenryhmä osallistuu projektin arviointiin ja kehittämiseen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy projektisuunnitelman kokouksissaan ja antaa muutos- ja korjausehdotukset.
